


工事新聞



空から
見る

今月の現場の様子



定点で進捗状況を報告いたします。来月もお楽しみに！


9月末時点



10月末時点



北面足場解体完了！

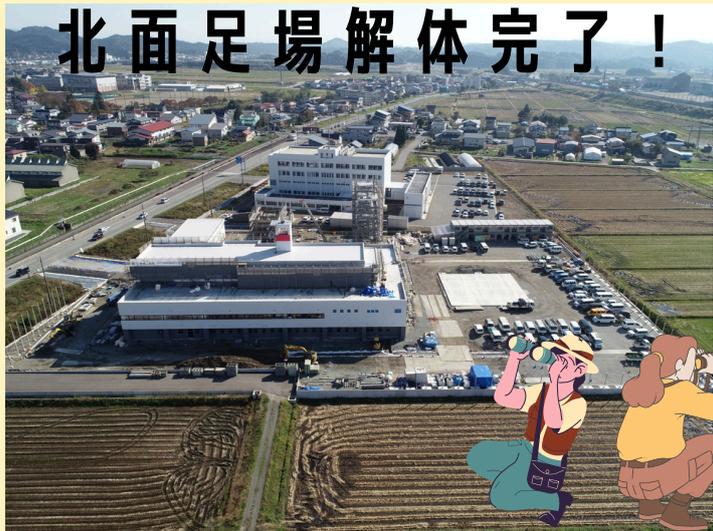

11月初旬の工事予定

庁舎棟では3階で内装工事、1・2階で内装仕上工事、東面で鉄骨工事をを行います。主訓練棟では外壁工事、副訓練棟では3階の鉄筋・型枠工事をを行います。また、外構工事として北面の浸透樹・側溝設置を行います。

2階内装仕上工事中



3階内装工事中



ヘリポットコンクリート打設完了！



今後の工程	庁舎棟	主訓練棟	副訓練棟	外構工事
11月初旬	東面鉄骨工事 3階内装工事 1・2階内装仕上工事	外壁工事	3階 鉄筋・型枠	北面 浸透樹 側溝設置
中旬	東面鉄骨工事 2・3階内装仕上工事 1階各種エント工事	防水工事 屋根工事	防水工事 外装工事	北面 浸透樹 側溝設置
下旬	東面外装工事 2・3階内装仕上工事 1階各種エント工事	外装工事	鉄骨工事 屋根工事	南面 浸透樹 側溝設置

問い合わせ先

最上広域消防本部 総務課

☎ 0233-22-7521(代) 0233-32-0452(直)

🌐 <https://mogami-kouiki.jp/soshiki/shobo/>

📍 山形県新庄市金沢字中村1279-1



11月の主な工事は、庁舎棟では1階各種エント工事、2・3階で内装仕上工事を行います。副訓練棟では3階躯体・外装工事、主訓練棟では外装工事、外構工事は浸透樹・側溝設置です。大型車通行等のご迷惑をおかけしますが第三者の安全を最優先に考え無事故での工事完成を目指します。
