


工事新聞



空から
見る

今月の現場の様子




定点で進捗状況を報告いたします。来月もお楽しみに！



3月末時点



4月末時点

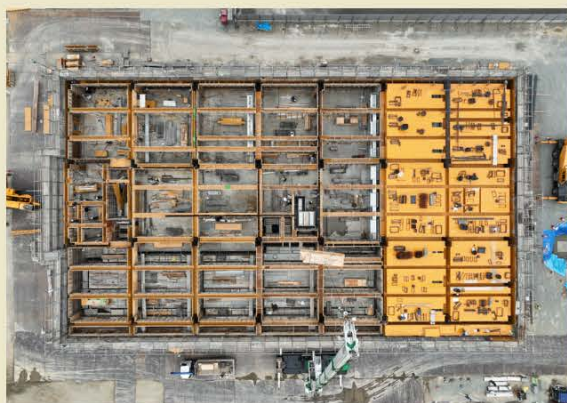

庁舎棟2階の鉄筋・型枠工事施工中

5月下旬の庁舎棟2階コンクリート打設に向けて、鉄筋・型枠工事を行っています。
付属棟1は5月中旬に鉄骨建て方を行う予定です。



付属棟1
基礎工事完了！

今後の工程

5月初旬	庁舎棟2階鉄筋・型枠	付属棟 ↓
中旬	庁舎棟2階鉄筋・型枠	
下旬	庁舎棟2階鉄筋・型枠 庁舎棟2階コンクリート打設	

5月の主な工事は、庁舎棟2階の鉄筋・型枠工事とコンクリート打設です。
付属棟1の鉄骨工事も行います。
大型車通行等のご迷惑をおかけしますが、第三者の安全を最優先に考え、無事故での工事完成を目指します。

問い合わせ先

最上広域消防本部 総務課

☎ 0233-22-7521(代) 0233-32-0452(直)

🌐 <https://mogami-kouiki.jp/soshiki/shobo/>

📍 山形県新庄市金沢字中村1279-1

